ID		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů
1		**Verejné obstarávania**	154 dny	1.12. 11	30.6. 12		
2		**Aktivita č.1 - Riadenie projektu (Podporná aktivita projektu)**	850 dny	1.4. 12	30.6. 15		
3		**Aktivita č.2 - Publicita a informovanosť (Podporná aktivita projekt**	850 dny	1.4. 12	30.6. 15		
4		**Aktivita č.3 – Príprava dokumentov na digitalizáciu a ich chemick**	850 dny	1.4. 12	30.6. 15		
5		Podaktivita č.3.1 – Príprava a logistika dokumentov	850 dny	1.4. 12	30.6. 15		
6		Podaktivita č.3.2 – Rekonštrukcia depozitov v budove SNK v Martine	782 dny	2.7. 12	29.6. 15 1		
7		Podaktivita č.3.3 – Dobudovanie IKDC Vrútky	196 dny	1.4. 12	26.12. 12		
8		Podaktivita č.3.4 - Sterilizácia	738 dny	1.9. 12	30.6. 15 1		
9		Podaktivita č.3.5 - Deacidifikácia	390 dny	1.1. 14	30.6. 15 1		
10		Podaktivita č.3.6 – Vstupno-výstupná kontrola kvality	738 dny	1.9. 12	30.6. 15 1		
11		**Aktivita č.4 – Digitalizácia**	850 dny	1.4. 12	30.6. 15		
12		Podaktivita č. 4.1 – Triedenie dokumentov do digitalizovaných tried	850 dny	1.4. 12	30.6. 15		
13		Podaktivita č. 4.2 – Digitalizačné linky a ich obsluha	850 dny	1.4. 12	30.6. 15		
14		Podaktivita č. 4.3 – Spracovanie digitalizovaných dokumentov a riader	717 dny	1.10. 12	30.6. 15 15		
15		Podaktivita č. 4.4 – Pracovné úložisko dát a technologická infraštruktú	133 dny	1.4. 12	28.9. 12		
16		**Aktivita č.5 – Archív (Digitalizácia a konzervovanie dokumentov S**	850 dny	1.4. 12	30.6. 15		
17							
18		Udržateľnosť - Príprava a logistika dokumentov	1437 dny	1.7. 15	31.12. 20 5		
19		Udržateľnosť - Sterilizácia	1437 dny	1.7. 15	31.12. 20 8		
20		Udržateľnosť - Deacidifikácia	1437 dny	1.7. 15	31.12. 20 9		
21		Udržateľnosť - Vstupno-výstupná kontrola kvality	1437 dny	1.7. 15	31.12. 20 10		
22		Udržateľnosť - Triedenie dokumentov do digitalizovaných tried	1437 dny	1.7. 15	31.12. 20 12		
23		Udržateľnosť - Digitalizačné linky a ich obsluha	1437 dny	1.7. 15	31.12. 20 13		
24		Udržateľnosť - Spracovanie digitalizovaných dokumentov a riadenie di	1437 dny	1.7. 15	31.12. 20 14		

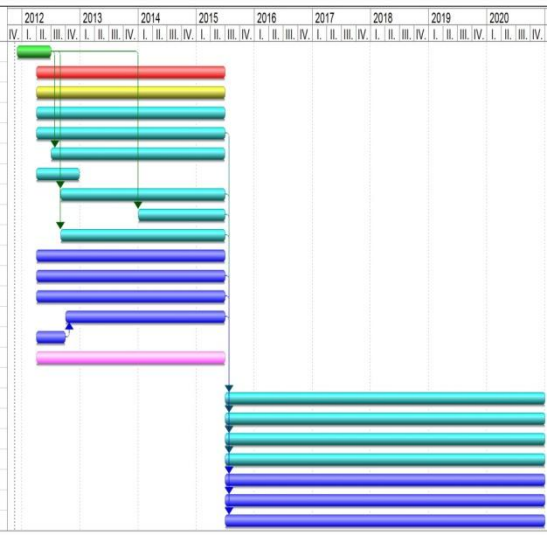

Príloha 4: Vecný a časový harmonogram projektu obsahuje Ganttova schéma.
